

Information April Maj 2019. [Se det i webbläsaren.](#)



Nyhetsbrev/Newsletter från SNB 22 april 2019

## INFORMATION! April-Maj / April-May 2019.

**Pågående och kommande aktiviteter. Present and upcoming activities.**



### **Ökad brandsäkerhet i Dackehus 1 C**

Bytet av takbeläggning och montering av en ny utrymningsväg på taket på Dacke 1C, som pågått under april, avslutas i början av maj månad.



### **Further improvements to the fire safety at Dacke 1C.**

Replacement of the roof coverings and installation of a new fire safety escape route on the roof at Dacke 1C has been done during April and will be finished in the beginning of May.

### **Brandskyddsarbetet med nytt brandlarm i Dacke 1A och Korpamoen**

Arbetet slutförs på Dacke 1A med ljudmätning av utrymningslarmet den 25-26 april. Montering av nytt brandlarm på Korpamoen startar den 26 april och beräknas vara klart den 2 maj. Slutbesiktning av utrymningslarmet på Dacke 1A och Korpamoen sker den 14 maj kl 13.00.

### **The fire protection works of new fire alarms at Dacke 1A and Korpamoen**


The work with the installation of a new fire alarm at Dacke 1A finish with a sound measurement of the fire alarm the 25-26 of April.

Installation of the new fire alarm at Korpamoen starts at the 26 of April and is



## Byte av tegelfasaden på Dacke 1A.

Fasadarbetet på Dacke 1A inleddes i början av april med etablering (vatten, el, stängsel, fasadklättrare). Rivningen av tegel startade den 15 april i sydvästra hörnet och det fortsätter i den nordvästra delen. En del ljudstörningar förekommer. I den mån det är möjligt sker mer omfattande ljudstörningar mitt på dagen. Uppmurningen av nytt tegel börjar i mitten av maj. Arbetet beräknas pågå i två månader med slutförande i till mitten av juli.

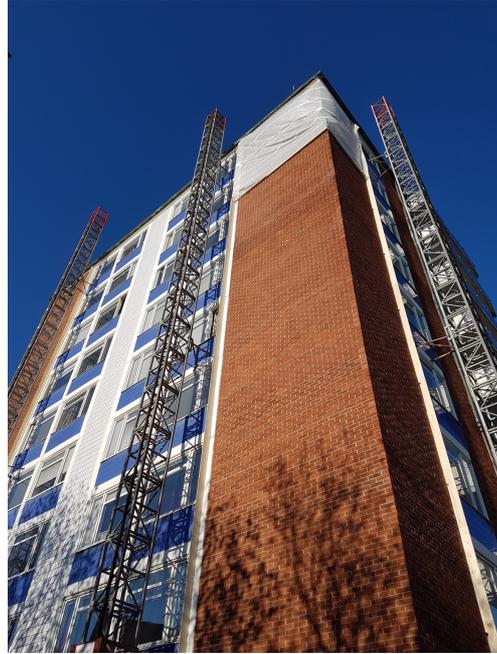

## Alteration of the brick façade of Dacke 1A

The façade work on Dacke 1A was initiated in the beginning of April with establishment (water, el, barriers, facade climber position). Demolition started from the 15 of April at the south-west corner and will continue at the north-west part. Some disturbances will come out of this. As far as it is possible, severe noise will take place in the middle of the day. Bricklaying work of new bricks will start in mid-May. The work is current estimated to be completed by mid-July.

## För frågor - kontakta oss

Om du har några frågor, kontakta Svetlana och Christian på Bostadskontoret! Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan: <https://snbostader.se/bostadskontor/>

Har du frågor om hur man gör felanmälan eller kontaktar störningsjouren - se information på hemsidan: <https://snbostader.se/felanmalan/>

Vänliga hälsningar  
Bengt Månsson  
Ordförande, Stiftelsen SNB

## Any questions - contact us

If you have any questions, please contact Svetlana or Christian at the office! You find contact details at our homepage: [hemsidan: https://snbostader.se/bostadskontor/](https://snbostader.se/bostadskontor/)

If you have questions about reports of fault and urgent damage - see information at our homepage: <https://snbostader.se/information-in-english/>

**Prenumerera**

**Dela**

Chairman, Stiftelsen SNB

---

Stiftelsen Smålands Nations Bostäder, Kastanjegatan 1 C: 1004, 223 59 Lund

För att avregistrera dig från nyhetsbrevet - unsubscribe from this newsletter - [klicka här](#).
